

Edifício-rede da Câmara Municipal de Agudo/RS



Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

O Legislativo é um dos poderes do Município. O outro é o Executivo.

A consagrada harmonia e a independência entre os poderes do Município, prescinde, dentre outros fatores, da autonomia institucional e funcional.

A Câmara Municipal de Agudo está instalada, desde 1991, em parte do Centro Administrativo Municipal, prédio público concebido para abrigar a estrutura administrativa do Poder Executivo.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Limitada em seu espaço físico, a Câmara Municipal deliberou, em 2007 (*12^a Legislatura*), construir seu Edifício-sede, em terreno próprio (Lei Municipal 1192/1998).

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS



- Terreno destinado
- Centro Administrativo Municipal

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Tomada a decisão de realizar a obra foram fixados os seguintes elementos e fundamentos que deveriam ser levados em conta na concepção do projeto arquitetônico.

- *Relação custo-benefício positivo para a comunidade, otimizando os recursos públicos nele empregados;*
- *Tamanho da obra compatível com a realidade presente, projetando a utilização no futuro;*
- *Contextualização do prédio com o espaço urbano onde será edificado;*
- *Multifuncionalidade dos espaços - notadamente do plenário, levando em conta a carência da cidade em espaço para abrigar eventos de auditório;*
- *Considerando a topografia do terreno, elevação do prédio com aproveitamento do subterrâneo para fins públicos;*

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Cronologia da obra 2007 - 2022

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Cronologia da obra 2007

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Elaboração do Projeto Executivo


Engenheiro Contratado

Carlos Henrique Roggia – CREA/RS 46746

- Pesquisa de Preço 1/2007 – 17ABR2007
- Termo de Contrato 3/2007 – 3MAI2007
- Valor – R\$ 12.250,00
- Recebimento do Projeto – 3SET2007

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo

Térreo

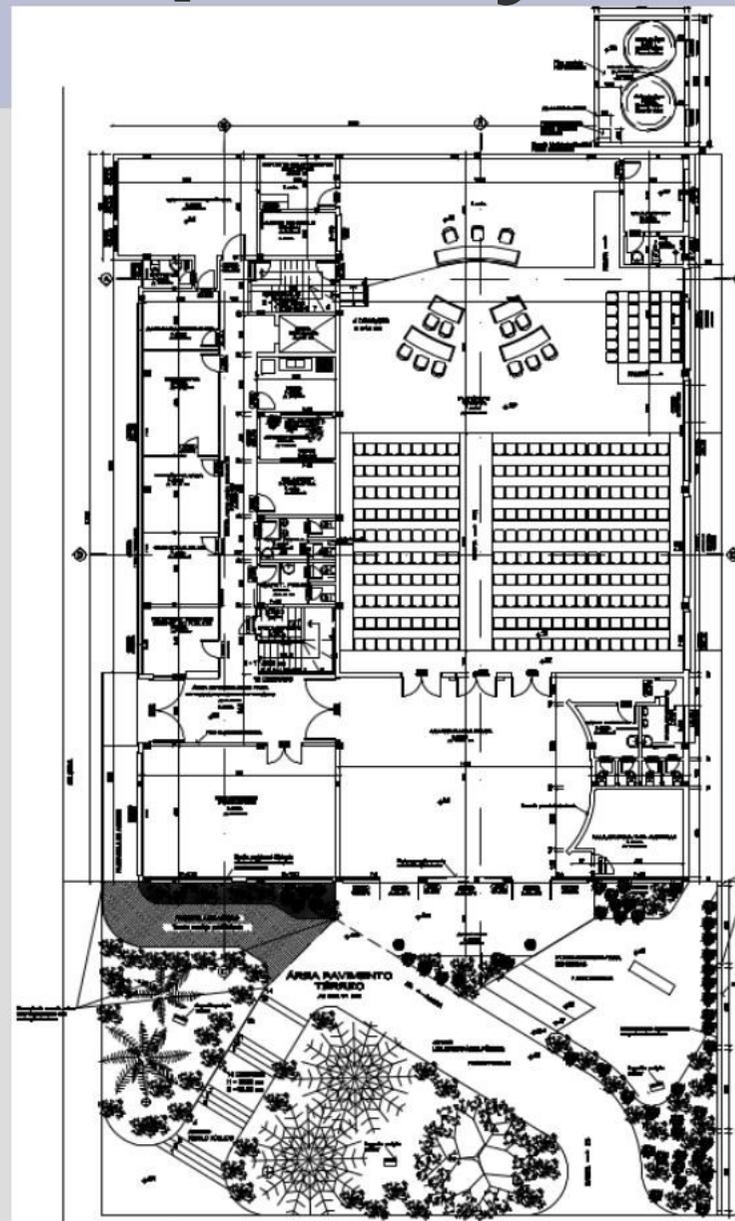

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Cronologia da obra 2008

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo

Elaboração do PPCI Plano de Prevenção e Combate à Incêndios

Carlos Henrique Roggia – CREA/RS 46746

**Certificado de Conformidade 22/1
(05/05/2008)**

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Cronologia da obra 2009

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Elaboração do SPDA Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (PÁRA-RAIOS)

Engenheiro Contratado

Gilson Della Valentina – CREA/RS 93073-D

- Nota de Empenho 196/2009
- Valor – R\$ 2.600,00
- Recebimento do Projeto – 29JUL2009

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

- Abertura do Processo Administrativo 4/2009 – 15/08/2009
- Objeto: **Execução da Etapa 1**
- Modalidade – Concorrência Pública
- Abertura do Processo Licitatório – Edital 1/2009 – 25/09/2009
- Julgamento da Licitação – 4/11/2009
- Empresa Vencedora: I. J. Construções Ltda. – CNPJ 07993430/0001-09
- Valor: R\$ 349.746,92
- Homologação – 5/11/2009

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Contrato 3/2009 – 10NOV2009

Prazo de execução – 240 dias

Contratante – CM Agudo: Ver. Valério Trebien

Contratada - I. J. Construções Ltda.

Valor: R\$ 349.746,92 (aumentado para R\$ R\$
392.843,46, pelo TA 1)

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Empresa de assessoria ao Fiscal de Contrato

- C.H. Roggia Construções Ltda.
- Contrato 4/2009 – 10/11/2009
- Valor – R\$ 650,00/mês, durante toda a execução, até o recebimento definitivo

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Início da obra
DEZ2009

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Cronologia da obra 2010

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 10MAI2010 foi firmado Termo Aditivo 1 ao Contrato 3/2009, pelo qual foi contratado acréscimo de itens no valor de R\$ 43.096,54, elevando o valor total da Etapa para 392.843,46.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Valor investido na Etapa 1 – R\$ 392.843,46

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Cronologia da obra 2011

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

- Abertura do Processo Administrativo 5/2011 – 27/01/2011
- Modalidade – Dispensa
- Objeto – Elaboração do projeto de climatização (ar condicionado) e alteração do projeto executivo básico para inclusão de sistema de armazenamento de água
- **Projeto de Climatização**
- Contratado: Engenheiro Mecânico JOELSON ALMEIDA BILHÃO, CREA/RS 154598
- Contrato 5/2011 (04/02/2011)
- Valor: R\$ 5.000,00

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

- Abertura do Processo Administrativo 5/2011 – 27/01/2011
- Modalidade – Dispensa
- Objeto – Elaboração do projeto de climatização (ar condicionado) e alteração do projeto executivo básico para inclusão de sistema de armazenamento de água
- **Alteração do projeto executivo básico**
- Contratado: C.H. Roggia Construções Ltda.
- Contrato 4/2011 - 04/02/2011
- Valor: R\$ 6.400,00 aumentado para R\$ 7.300,00 pelo Termo Aditivo 2

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

- Abertura do Processo Administrativo 8/2011 – 08/09/2011
- Objeto: **Execução da Etapa 2**
- Modalidade – Concorrência Pública
- Abertura do Processo Licitatório – Edital 2/2011 – 27/09/2011
- Julgamento da Licitação – 3/11/2011
- Empresa Vencedora: I. J. Construções Ltda.
- Valor: R\$ 425.934,07
- Homologação – 3/11/2011

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Contrato 7/2011 - 07/11/2011

Prazo de execução – 180 dias

Contratante: CM Agudo – Ver. Itamar Puntel

Contratado: I. J. Construções – Ivo Darcilo Jann

Valor: 425.934,07 (aumentado para
R\$ 430.591,60 pelo TA 1)

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Cronologia da obra 2012

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Processo 2/2012 - 04JAN2012

Contrato 1/2012 – 06/01/2012

Objeto: Assessoria ao Fiscal de Contrato

Contratado: C.H. Roggia Construções Ltda.

Valor – R\$ 758,55/mês, durante toda a execução, até o recebimento definitivo

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Processo 3/2012

Contrato 2/2012 – 06/02/2012

Objeto: Elaboração de Maquete Eletrônica

Contratado: Arq. RAQUEL CRISTINE SCHWERZ

Valor – R\$ 1.600,00, aumentado para R\$ 1.800,00 pelo
Termo Aditivo 1

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 29MAI2012 foi firmado Termo Aditivo 1 ao Contrato 7/2011, pelo qual foram alterados itens do objeto contratado, por supressão e acréscimo. Com esta alteração o montante foi aumentado em R\$ 4.657,53, elevando o valor total da Etapa 2 para R\$ 430.591,60.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Valor investido na Etapa 2 – **R\$ 430.591,60**

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Valor investido na Etapa 1 –	R\$ 392.843,46
Valor investido na Etapa 2 –	R\$ 430.591,60
TOTAL INVESTIDO	R\$ 823.435,06

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

- Abertura do Processo Administrativo 7/2012 – 15/10/2012
- Objeto: **Execução da Etapa 3**
- Modalidade – Concorrência Pública
- Abertura do Processo Licitatório – Edital 1/2012 – 18/10/2012
- Julgamento da Licitação – 20/11/2012
- Empresa Vencedora: I. J. Construções Ltda.
- Valor: R\$ 172.856,02
- Homologação – 3/11/2011

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Contrato 7/2012 – 05DEZ2012

Prazo de execução – 120 dias

Contratante – CM Agudo: Ver. Paulo Unfer

Contratada - I. J. Construções Ltda.

Valor: 172.856,02 (aumentado para R\$ 190.450,42 pelo TA 1 e diminuído para R\$ 176.024,65 pelo TA 2)

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Processo 8/2012 – 06/12/2012

Contrato 8/2012 – 10/12/2012

Objeto: **Assessoria ao Fiscal de Contrato**

Contratado: C.H. Roggia Construções Ltda.

Valor – R\$ 797,84/mês, durante toda a execução, até o recebimento definitivo

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Cronologia da obra 2013

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 9ABR2013 foi firmado Termo Aditivo 1 ao Contrato 7/2012, para prorrogação de prazo e Acréscimo de itens ao objeto contratado. Com essa alteração o valor foi aumentado em R\$ 17.595,40, elevando o valor total da Etapa 3 para R\$ 190.450,42.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 1.ºJUL2013 foi firmado Termo Aditivo 2 ao Contrato 7/2012, para supressão de itens ao objeto contratado.

Com essa alteração o valor foi reduzido em R\$ 14.425,77, reduzindo o valor total da Etapa 3 para R\$ 176.024,65.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Valor investido na Etapa 3 – **R\$ 176.024,65**

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Valor investido na Etapa 1 –	R\$ 392.643,46
Valor investido na Etapa 2 –	R\$ 430.591,60
Valor investido na Etapa 3 –	R\$ 176.024,65
TOTAL INVESTIDO	R\$ 999.459,71

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Cronologia da obra 2014

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

- Abertura do Processo Administrativo 5/2013 – 26/09/2013
- Objeto: **Execução da Etapa 4 (1.ª LICITAÇÃO)**
- Modalidade – Concorrência Pública
- Abertura do Processo Licitatório – Edital 1/2013 – 14/11/2013
- Julgamento da Licitação – 04/01/2014
- Resultado: Licitação FRACASSADA

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

- Abertura do Processo Administrativo 8/2014 – 1.º/07/2014
- Objeto: **Execução da Etapa 4 (2.ª LICITAÇÃO)**
- Modalidade – Concorrência Pública
- Abertura do Processo Licitatório – Edital 2/2014 – 16/07/2014
- Julgamento da Licitação – 03/09/2014
- Resultado: Licitação DESERTA

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

- Abertura do Processo Administrativo 9/2014 – 08/09/2014
- Objeto: **Execução da Etapa 4 (3.ª LICITAÇÃO)**
- Modalidade – Concorrência Pública
- Abertura do Processo Licitatório – Edital 3/2014 – 17/09/2014
- Julgamento da Licitação – 03/11/2014
- Resultado: Licitação FRACASSADA
- Homologação: 12/11/2014

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

- Abertura do Processo Administrativo 10/2014 – 19/11/2014
- Objeto: **Execução da Etapa 4 (4.ª LICITAÇÃO)**
- Modalidade – Concorrência Pública
- Abertura do Processo Licitatório – Edital 3/2014 – 21/11/2014
- Julgamento da Licitação – 26/12/2014
- Resultado: Licitação DESERTA
- Homologação: 26/12/2014

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Cronologia da obra 2015

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

- Abertura do Processo Administrativo 1/2015 – 05/01/2015
- Objeto: **Execução da Etapa 4 (5.ª LICITAÇÃO)**
- Modalidade – Concorrência Pública
- Abertura do Processo Licitatório – Edital 1/2015 – 16/01/2015
- Julgamento da Licitação – 10/03/2015
- Empresa vencedora: JRW Engenharia e Arquitetura Ltda.
- Valor: R\$ 505.447,01
- Homologação: 10/03/2015

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Contrato 4/2015 – 13MAR2015

Prazo de execução – 150 dias + 210 dias (Termos Aditivos)

Contratante – CM Agudo: Ver. Cleber Cassel

Contratada – JRW Engenharia e Arquitetura Ltda.

Valor: R\$ 505.447,01 (aumentado para R\$ 511.464,21, pelo Termo Aditivo 4/2015; aumentado para R\$ 516.248,25 pelo reequilíbrio econômico-financeiro; aumentado para R\$ 519.068,47 pelo Termo Aditivo 6; aumentado para R\$ 540.436,59 pelo Termo Aditivo 8)

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Processo 5/2015 – 13/03/2015

Contrato 5/2015 – 16/03/2015

Objeto: Assessoria ao Fiscal de Contrato

Contratado: C.H. Roggia Construções Ltda.

Valor – R\$ 1.200,00/mês, durante toda a execução, até o recebimento definitivo

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Processo 6/2015 – 02/04/2015

Contrato 6/2015 – 10/04/2015

Objeto: **Elaboração do projeto para obtenção do APPCI – Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio** (o projeto de 2008 foi superado pelo advento da Lei Complementar Estadual 4376/2013)

Contratado: C.H. Roggia Construções Ltda.

Valor – R\$ 5.000,00

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 30MAR2015 foi firmado Termo Aditivo 1 ao Contrato 4/2015, para alteração da c/c destinada ao depósito da Garantia de Contrato.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 22MAIO2015 foi firmado Termo Aditivo 2 ao Contrato 4/2015, para substituição da modalidade de Garantia de Contrato de *depósito em c/c* por *Seguro-Garantia*.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 6AGO2015 foi firmado Termo Aditivo 1 ao Contrato 6/2015, por prorrogação de prazo para 240 dias da assinatura.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 10AGO2015 foi firmado Termo Aditivo 3 ao Contrato 4/2015, por prorrogação de prazo em 90 dias.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 18SET2015 foi firmado Termo Aditivo 4 ao Contrato 4/2015, por supressão e acréscimo de itens. Com esta modificação o valor do contrato foi aumentado em R\$ 6.017,20.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 16NOV2015 foi firmado Termo Aditivo 5 ao Contrato 4/2015, por prorrogação de prazo em 30 dias.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 30NOV2015 foi deferido Reequilíbrio econômico -financeiro ao Contrato 4/2015 em R\$ 4.784,04.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 04DEZ2015 foi firmado Termo Aditivo 6 ao Contrato 4/2015, por acréscimo e supressão de itens. Com esta modificação o contrato foi aumentado em R\$ 2.820,22.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 29DEZ2015 foi firmado Termo Aditivo 2 ao Contrato 6/2015, por prorrogação de prazo para 340 dias da assinatura.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Cronologia da obra 2016

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 15MAR2016 a Câmara Municipal recebeu Laudo Técnico para recebimento provisório, elaborado por C.H. Roggia Construções Ltda.

Em 15MAR2016 o Laudo Técnico foi remetido para a Empreiteira J R W Engenharia e Arquitetura Ltda.

Em 29MAR2016 J RW Engenharia e Arquitetura Ltda. respondeu ao laudo.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 4ABR2016 a Câmara Municipal recebeu Laudo Técnico sobre situação do telhado da obra, elaborado por C.H. Roggia Construções Ltda.

Em 4ABR2016 o Laudo Técnico foi remetido para a Empreiteira J R W Engenharia e Arquitetura Ltda.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 28ABR2016 foi firmado Termo Aditivo 3 ao Contrato 6/2015, por prorrogação de prazo para 480 dias da assinatura.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 2MAI2016 J RW Engenharia e Arquitetura Ltda. se manifestou sobre o laudo.

Em 3MAI2016 a Câmara Municipal notificou a empresa J R W Engenharia e Arquitetura Ltda. da suspensão do prazo de execução do Contrato 4/2015 a contar daquela data.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 14JUN2016 a Câmara Municipal elaborou Relatório de Providências sobre as avarias do telhado do prédio

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 3AGO2016 a Câmara Municipal firmou o Termo Aditivo 8, contemplando o conserto do telhado.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 26DEZ2016 foi firmado Termo Aditivo 4 ao Contrato 6/2015, por prorrogação de prazo para 720 dias da assinatura.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 28DEZ2016 foi lavrado o Termo de Recebimento Provisório da etapa 4 – Contrato 4/2015.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Valor investido na Etapa 4 – **R\$ 540.436,59**

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Valor investido na Etapa 1 –	R\$ 392.643,46
Valor investido na Etapa 2 –	R\$ 430.591,60
Valor investido na Etapa 3 –	R\$ 176.024,65
Valor investido na Etapa 4 –	R\$ 540.436,59

TOTAL INVESTIDO	R\$ 1.539.696,30
------------------------	-------------------------

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Cronologia da obra 2017

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Abertura do Processo Administrativo 2/2017 – 06JAN2017

Modalidade – Dispensa

Objeto – Definição do objeto e elaboração da planilha orçamentária para a execução da Etapa 5, no valor de até R\$ 700.000,00

Contratado: C.H. Roggia Construções Ltda.

Contrato 1/2017 - 10/01/2017

Valor: R\$ 6.750,00

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 30MAR2017 foi firmado Termo Aditivo 5 ao Contrato 6/2015, por prorrogação de prazo para 1440 dias da assinatura.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 23MAI2017 foi instaurada Sindicância Investigativa para apurar eventual negligência da Câmara de que tenha resultado dano ao telhado – Portaria 29/2017.
Processo 2/2017, da Comissão Processante do Município.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

- Abertura do Processo Administrativo 5/2017 – 20/06/2017
- Objeto: **Execução da Etapa 5 (1.ª LICITAÇÃO)**
- Modalidade – Concorrência Pública
- Abertura do Processo Licitatório – Edital 2/2017 – 12/07/2017
- Julgamento da Licitação – 14/08/2015
- Licitação DESERTA (Ata 1/2017 – Comissão Especial de Licitações)

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 03JUL a Comissão de Recebimento Provisório
Elaborou relatório com diligências à empresa
Contratada, solicitando correções.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

- Abertura do Processo Administrativo 7/2017 – 24/08/2017
- Objeto: **Execução da Etapa 5 (2.^a LICITAÇÃO)**
- Modalidade – Concorrência Pública
- Abertura do Processo Licitatório – Edital 3/2017 – 28/08/2017
- Julgamento da Licitação – 05/10/2017
- Licitação revogada em 14/11/2017

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

- Abertura do Processo Administrativo 8/2017 – 04/12/2017
- Objeto: **Execução da Etapa 5 (3.ª LICITAÇÃO)**
- Modalidade – Concorrência Pública
- Abertura do Processo Licitatório – Edital 4/2017 – 14/12/2017
- Julgamento da Licitação – 16/01/2018
- Empresa habilitada: Construtora São Sepé Ltda. EPP – CNPJ 05091767/0001-97
- Valor: R\$ 492.000,00
- Data da homologação: 17/01/2018
- Data da adjudicação: 17/01/2018

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 05DEZ2017 o Vice-Presidente despachou pelo arquivamento do processo 2/2017, da Comissão de Comissão Processante, sobre a Sindicância Investigativa, isentando a Câmara Municipal do cometimento de eventual ato desidioso ou de negligência.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Cronologia da obra 2018

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Contrato 1/2018 – 22JAN2018

Prazo de execução – 120 dias

Prazo de Vigência – 210 dias

Ordem de Serviço – 29JAN2018

Objeto – **Execução da Etapa 5**

Contratante – CM Agudo: Ver. Alexandre Neu

Contratada – Construtora São Sepé Ltda. - EPP – CNPJ

05091767/0001-97

Valor – R\$ 492.500,00

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Processo 5/2018 – 25/01/2018

Modalidade: Dispensa de Licitação

Contrato 2/2018 – 1º/02/2018

Vigência – 210 dias

**Objeto: Assessoria ao Fiscal de Contrato 1/2018 –
execução da Etapa 5**

Contratado: C.H. Roggia Construções Ltda.

Valor – R\$ 1.500,00/mês, durante toda a execução, até o recebimento definitivo.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 24MAI2018 foi firmado Termo Aditivo 1 ao Contrato 1/2018, por prorrogação de prazo para 150 dias da assinatura.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 4JUN2018 foi firmado Termo Aditivo 2 ao Contrato 1/2018, por acréscimo de itens e aumento do valor contratado em R\$ 30.720,00.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 29JUN2018 foi firmado Termo Aditivo 3 ao Contrato 1/2018, por prorrogação de prazo para 180 dias da assinatura.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 26JUL2018 foi firmado Termo Aditivo 4 ao Contrato 1/2018, por prorrogação de prazo para 210 dias da assinatura.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 5SET2018 foi firmado Termo Aditivo 5 ao Contrato 1/2018, por acréscimo de itens e aumento do valor contratado em R\$ 21.356,78 e aumento de prazo para 250 dias.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 19SET2018 foi lavrado Termo de Suspensão do Prazo de execução do Contrato 1/2018, por tempo Indeterminado.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 16OUT2018 foi lavrado Termo de levantamento da Suspensão do Prazo de execução do Contrato 1/2018.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 22OUT2019 foi firmado Termo Aditivo 6 ao Contrato 1/2018, por prorrogação de prazo para 290 dias.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 27FEV2019 foi lavrado o Termo de Notificação Unilateral do contrato 1/2018.

Em 22MAR2019 foi recebido a Contra- Notificação Extrajudicial.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 31MAI2019 firmado Termo Aditivo 7 ao Contrato 1/2018, por prorrogação de prazo para 460 dias.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 04JUN2019 firmado Termo Aditivo 8 ao Contrato 1/2018, por prorrogação de prazo para 510 dias.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 10AGO2019 foi firmado Termo Aditivo 9 ao Contrato 1/2018, com glosa de valor de R\$ 19.662,18, por serviço não executado.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 19AGO2019 foi lavrado Termo de Recebimento Provisório da etapa 5 do Contrato 1/2018.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 08NOV2019 foi lavrado Termo de Recebimento Definitivo da etapa 5 do Contrato 1/2018.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Cronologia da obra 2022

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Contrato 2/2022 – 28MAR2022

Prazo de execução – 120 dias

Prazo de Vigência – 120 dias

Ordem de Serviço – 04ABR2022

Objeto – **Execução da Etapa 6**

Contratante – CM Agudo: Ver^a. Izabel Lamaison

Contratada – ASM Construtora Ltda. - ME – CNPJ

41.876.591/0001-42

Valor – R\$ 264.117,45

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Processo 11/2022 – 04/04/2022

Modalidade: Dispensa de Licitação

Contrato 3/2022 – 04/04/2022

Vigência – 120 dias

Objeto: Assessoria ao Fiscal de Contrato 2/2022 – execução da Etapa 6

Contratado: C.H. Roggia Construções Ltda.

Valor – R\$ 2.000,00/mês, durante toda a execução, até o recebimento definitivo.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 12ABR2022 foi firmado Termo Aditivo 1 ao Contrato 2/2022, por acréscimo de itens e aumento do valor contratado em R\$ 12.984,09.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 28MAR2022 foi firmado Termo Aditivo 2 ao Contrato 2/2022, por prorrogação de prazo.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 28MAR2022 foi firmado Termo Aditivo 3 ao Contrato 2/2022, por glosa de valor de R\$ 17.744,91 por serviços não executados.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 01SET2022 foi lavrado Termo de Recebimento Provisório da Etapa 6 do contrato 2/2022.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Em 06SET2022 foi lavrado Termo de Recebimento Definitivo da Etapa 6 do contrato 2/2022.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Contrato 6/2022 – 27DEZEMBRO2022

Prazo de execução – 30 dias

Prazo de Vigência – 30 dias

Ordem de Serviço – 04JAN2023

Objeto – **Execução da Etapa 7**

Contratante – CM Agudo: Ver. Auro Kirinus

Contratada – ASM Construtora Ltda. - ME – CNPJ

41.876.591/0001-42

Valor – R\$ 59.201,51

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Processo 5/2023 – 13/01/2023

Modalidade: Dispensa de Licitação

Contrato 6/2022 – 13/01/2023

Vigência – 30 dias

Objeto: Assessoria ao Fiscal de Contrato 6/2022 – execução da Etapa 7

Contratado: C.H. Roggia Construções Ltda.

Valor – R\$ 2.200,00/mês, durante toda a execução, até o recebimento definitivo.

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Valor investido na Etapa 1 – R\$ 392.643,46

Valor investido na Etapa 2 – R\$ 430.591,60

Valor investido na Etapa 3 – R\$ 176.024,65

Valor investido na Etapa 4 – R\$ 540.436,59

Valor investido na Etapa 5 – R\$ 472.837,82

Valor investido na Etapa 6 – R\$ 259.356,63

Valor investido na Etapa 7 – R\$ 59.201,51

TOTAL INVESTIDO R\$ 2.331.092,26

Edifício-sede da Câmara Municipal de Agudo/RS

Todos os documentos referidos neste relatório estão à
disposição em
<[www.agudo.rs.leg.br/Transparencia/Licitações e Contratos](http://www.agudo.rs.leg.br/Transparencia/Licitacoes_e_Contratos)>
ou na Diretoria Geral da Câmara

Atualizado em 27 ABRIL de 2022
